

Plano de Ação - Requalificação dos Espaços Físicos

Complexo Multiuso 2 | Setor 1 - Bloco 6 | **Página 1 de 5**

Serviços previstos em cada sala: troca do forro por gesso acartonado, novo sistema de iluminação, higienização dos ares-condicionados, troca de tomadas elétricas, pintura das paredes e requalificação do cabeamento de projeção dos datashows.

1



Quadrante 1 — Substituição da claraboia por calha galvanizada

Status: Concluído

Período: Concluído anteriormente

Descrição: Intervenção preparatória já executada no Quadrante 1, necessária para conter infiltrações e permitir a revitalização segura das salas 60401, 60402 e 60403.

2



Sala 60402 — Revitalização concluída

Status: Concluído

Período: Concluído anteriormente

Descrição: Sala já requalificada com novo forro, iluminação, pintura, revisão elétrica, higienização dos ares-condicionados e adequação do cabeamento de projeção.

3



Sala 60401 — Revitalização

Status: Programado

Período: 11/05/2026 a 24/05/2026

Descrição: Execução completa da reforma/requalificação da sala, com todos os serviços previstos no escopo padrão.

4



Sala 60403 — Revitalização

Status: Programado

Período: 25/05/2026 a 07/06/2026

Descrição: Execução completa da reforma/requalificação da sala, após a conclusão da Sala 60401.

5



Quadrante 2 — Substituição da claraboia por calha galvanizada

Status: Em paralelo

Período: 11/05/2026 a 07/06/2026

Descrição: Instalação da calha galvanizada no lugar da claraboia do Quadrante 2 em paralelo à revitalização final do Quadrante 1, preparando a sequência de obras nas salas 60407 a 60411.



As intervenções seguem a lógica de execução por quadrantes, com 14 dias corridos para cada sala.

Plano de Ação - Requalificação dos Espaços Físicos

Complexo Multiuso 2 | Setor 1 - Bloco 6 | **Página 2 de 5**

Serviços previstos em cada sala: troca do forro por gesso acartonado, novo sistema de iluminação, higienização dos ares-condicionados, troca de tomadas elétricas, pintura das paredes e requalificação do cabeamento de projeção dos datashows.

6



Sala 60407 - Revitalização

Status: Programado

Período: 08/06/2026 a 21/06/2026

Descrição: Execução completa da reforma/requalificação da sala, iniciando a sequência de revitalização do Quadrante 2.

7



Sala 60408 - Revitalização

Status: Programado

Período: 22/06/2026 a 05/07/2026

Descrição: Execução completa da reforma/requalificação da sala, na sequência da Sala 60407.

8



Sala 60409 - Revitalização

Status: Programado

Período: 06/07/2026 a 19/07/2026

Descrição: Execução completa da reforma/requalificação da sala, na sequência da Sala 60408.

9



Sala 60410 - Revitalização

Status: Programado

Período: 20/07/2026 a 02/08/2026

Descrição: Execução completa da reforma/requalificação da sala, na sequência da Sala 60409.

10



Sala 60411 - Revitalização

Status: Programado

Período: 03/08/2026 a 16/08/2026

Descrição: Execução completa da reforma/requalificação da sala, concluindo a etapa de revitalização do Quadrante 2.




As intervenções seguem a lógica de execução por quadrantes, com 14 dias corridos para cada sala.

Plano de Ação - Requalificação dos Espaços Físicos

Complexo Multiuso 2 | Setor 1 - Bloco 6 | **Página 3 de 5**

Serviços previstos em cada sala: troca do forro por gesso acartonado, novo sistema de iluminação, higienização dos ares-condicionados, troca de tomadas elétricas, pintura das paredes e requalificação do cabeamento de projeção dos datashows.

11

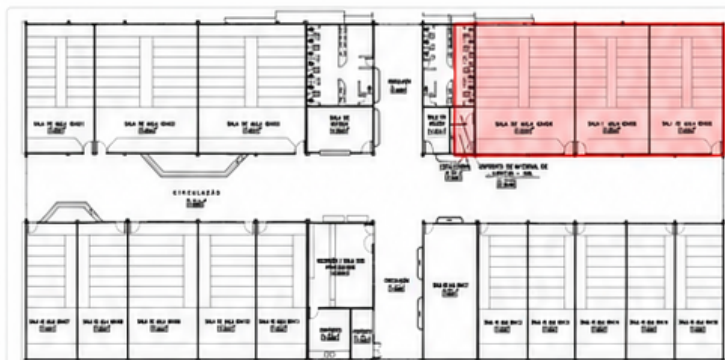

Quadrante 3 - Substituição da claraboia por calha galvanizada

Status: Em paralelo

Período: 08/06/2026 a 16/08/2026

Descrição: Instalação da calha galvanizada no lugar da claraboia do Quadrante 3 durante a execução das salas do Quadrante 2, preparando a sequência de revitalização das salas 60404, 60405 e 60406.

12




Sala 60404 - Revitalização

Status: Programado

Período: 17/08/2026 a 30/08/2026

Descrição: Execução completa da reforma/requalificação da sala, iniciando a etapa de revitalização do Quadrante 3.

13

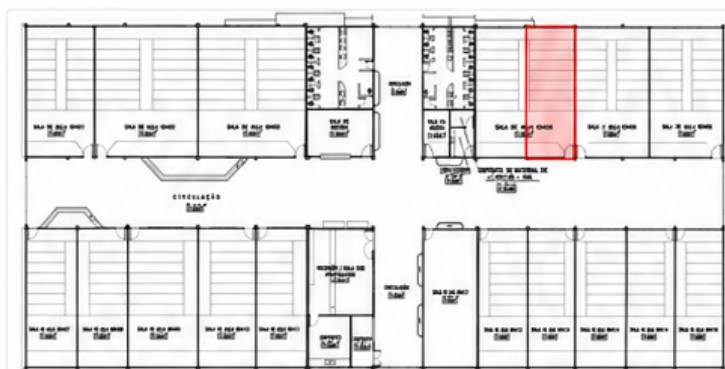


Sala 60405 - Revitalização

Status: Programado

Período: 31/08/2026 a 13/09/2026

Descrição: Execução completa da reforma/requalificação da sala, na sequência da Sala 60404.

14

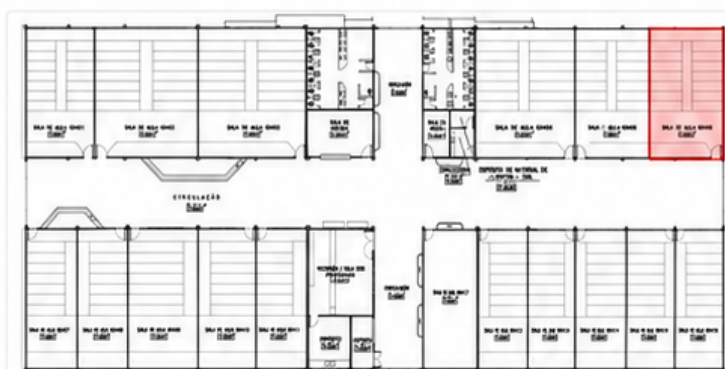

Sala 60406 - Revitalização

Status: Programado

Período: 14/09/2026 a 27/09/2026

Descrição: Execução completa da reforma/requalificação da sala, concluindo a etapa de revitalização do Quadrante 3.



As intervenções seguem a lógica de execução por quadrantes, com 14 dias corridos para cada sala.

Plano de Ação - Requalificação dos Espaços Físicos

Complexo Multiuso 2 | Setor 1 - Bloco 6 | **Página 4 de 5**

Serviços previstos em cada sala: troca do forro por gesso acartonado, novo sistema de iluminação, higienização dos ares-condicionados, troca de tomadas elétricas, pintura das paredes e requalificação do cabeamento de projeção dos datashows.

15



Quadrante 4 - Substituição da claraboia por calha galvanizada

Status: Em paralelo

Período: 17/08/2026 a 27/09/2026

Descrição: Instalação da calha galvanizada no lugar da claraboia do Quadrante 4 durante a execução das salas do Quadrante 3, preparando a sequência de revitalização das salas 60412, 60413, 60414, 60415 e 60416.

16



Sala 60412 - Revitalização

Status: Programado

Período: 28/09/2026 a 11/10/2026

Descrição: Execução completa da reforma/requalificação da sala, iniciando a etapa de revitalização do Quadrante 4.

17



Sala 60413 - Revitalização

Status: Programado

Período: 12/10/2026 a 25/10/2026

Descrição: Execução completa da reforma/requalificação da sala, na sequência da Sala 60412.

18



Sala 60414 - Revitalização

Status: Programado

Período: 26/10/2026 a 08/11/2026

Descrição: Execução completa da reforma/requalificação da sala, na sequência da Sala 60413.

19



Sala 60415 - Revitalização

Status: Programado

Período: 09/11/2026 a 22/11/2026

Descrição: Execução completa da reforma/requalificação da sala, na sequência da Sala 60414.

20



Sala 60416 - Revitalização

Status: Programado

Período: 23/11/2026 a 06/12/2026

Descrição: Execução completa da reforma/requalificação da sala, concluindo a etapa de revitalização do Quadrante 4 e o plano geral de revitalização.




As intervenções seguem a lógica de execução por quadrantes, com 14 dias corridos para cada sala.

Plano de Ação - Requalificação dos Espaços Físicos

Complexo Multiuso 2 | Setor 1 - Bloco 6 | **Página 5 de 5**

A etapa final contempla intervenções complementares no bloco, incluindo a requalificação da iluminação dos corredores e a construção do complexo de banheiros públicos anexo.

21

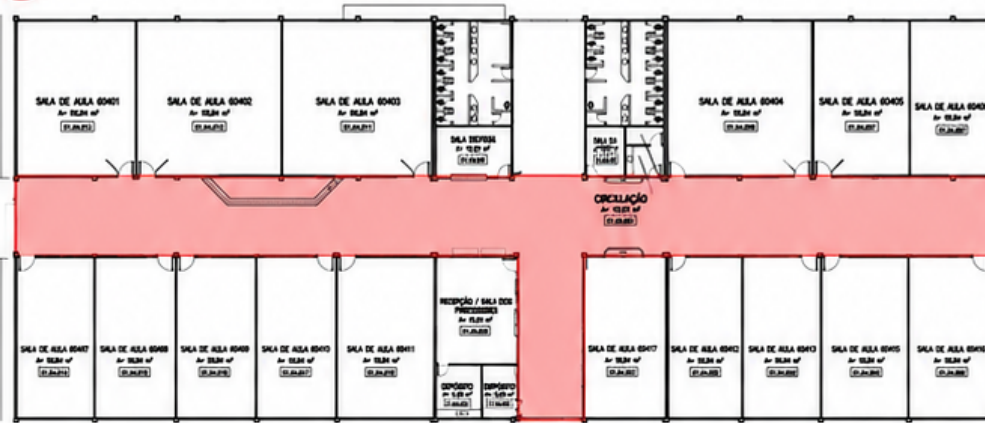


Requalificação da Iluminação dos Corredores

Status: Programado

Período: 18/05/2026 a 30/06/2026

Descrição: Esta intervenção consiste na requalificação completa do sistema de iluminação dos corredores do bloco, incluindo a substituição e modernização das luminárias, revisão da infraestrutura elétrica e melhoria das condições de iluminação das áreas de circulação. A execução poderá ocorrer em paralelo às demais obras.

22

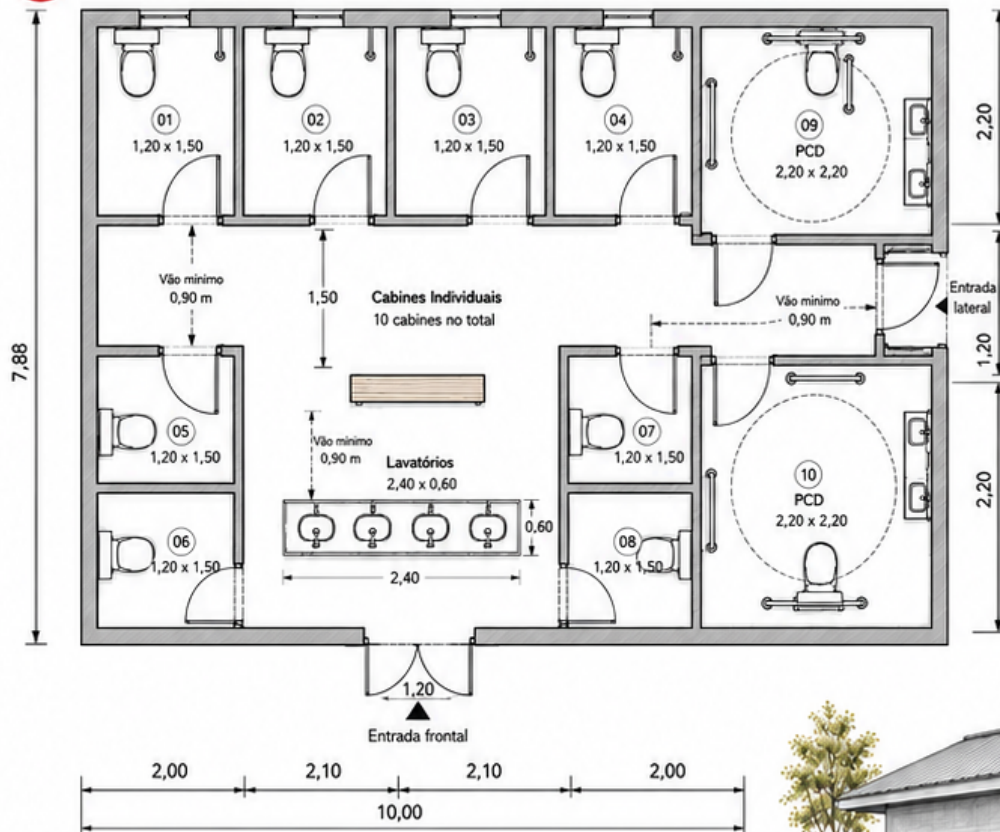

Construção do Complexo de Banheiros Públicos - Anexo ao Bloco

Status: Programado

Período: 01/06/2026 a 30/09/2026

Descrição: A obra contempla a construção de um complexo de banheiros públicos anexo ao bloco, com 10 cabines individuais, sendo 8 padrão e 2 PCD, lavatórios coletivos, circulação acessível, acessos frontal e lateral, e atendimento às condições de acessibilidade.

Elementos principais:

- 10 cabines no total
- 8 cabines padrão (1,20 x 1,50 m)
- 2 cabines PCD (2,20 x 2,20 m)
- Lavatórios coletivos
- Área construída aproximada: 78,8 m²

LEGENDA

01 a 08 Cabines Individuais Padrão (1,20 x 1,50 m)

09 e 10 Cabines Individuais PCD (2,20 x 2,20 m)

